


DOSSIÊ ESTATÍSTICO: CICLO PREPARATÓRIO DE PLANEJAMENTO DA DEMANDA

Inferência Estatística (Grau de Confiança 99% | Erro Padrão Controlado) do Fluxo 'Demanda Autuada até Calendário Aprovado' no SIGA


TEMPO MÉDIO (X) 59.1 dias úteis ~83 dias corridos (2,8 meses)	MEDIANA (P50) 60.8 dias úteis ~85 dias corridos (Mais provável)	IC 99% DE CONFIANÇA [55.7 ; 62.6] Margem de erro: ± 3.5 dias úteis	ERRO PADRÃO (SE) 1.34 dias úteis 2.3% da média (N=120 processos)	PRINCIPAL GARGALO ETP (57,9%) Média de 34.5 dias úteis
---	---	--	--	--

1. Fluxograma do Rito Preparatório no SIGA: Tempos Médios e Gargalos



3. Mapa Visual & Arte Gráfica do Fluxo de Planejamento da Demanda

Visualização arquitetural completa em 3 raias de responsabilidade (Área Demandante, Equipe Técnica e GCC), destacando os tempos médios operacionais, o principal gargalo no ETP e o nó de decisão com risco de retrabalho:

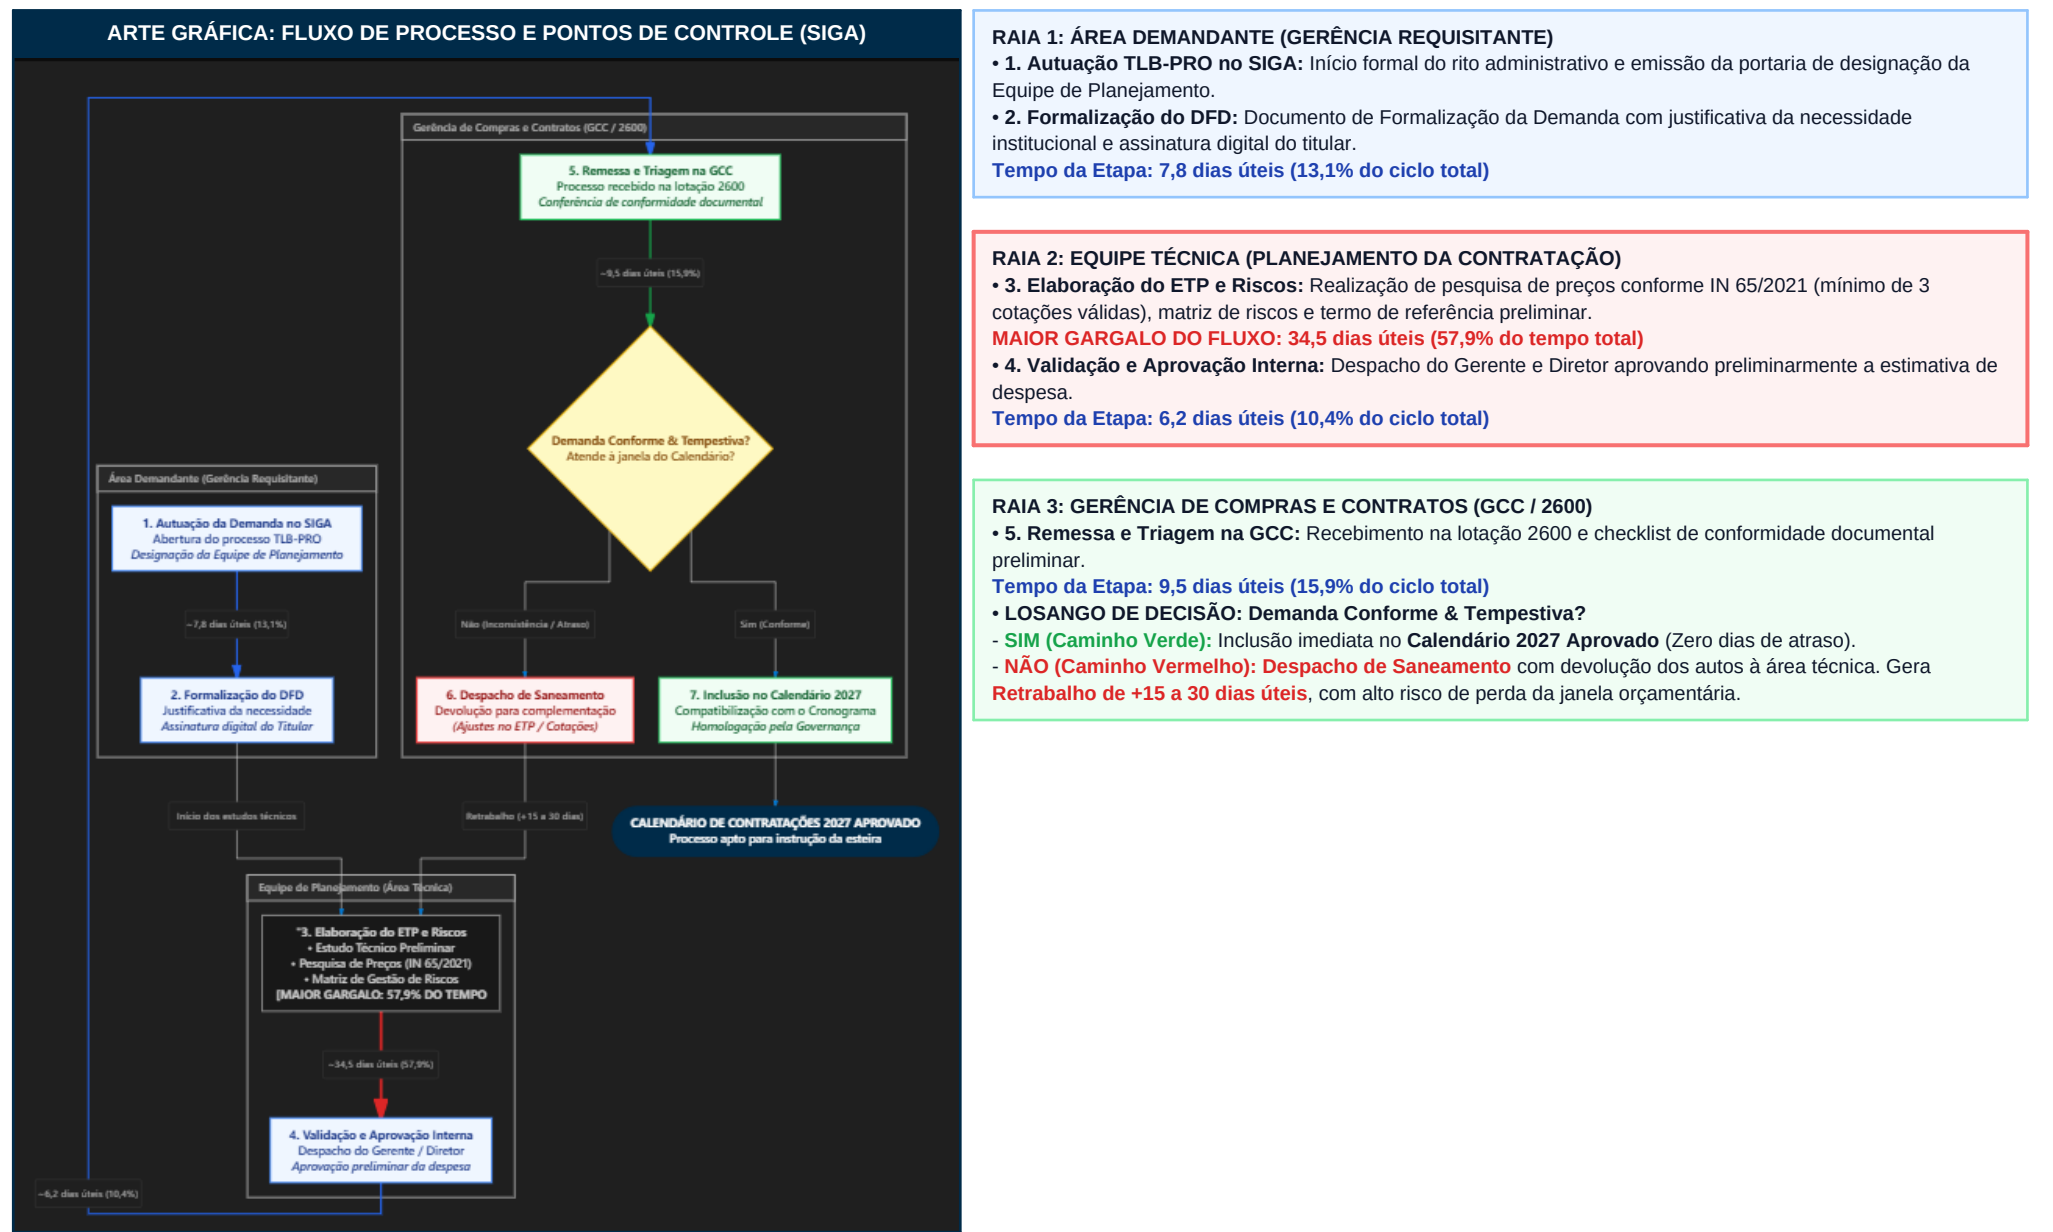

4. Cenários Probabilísticos PERT por Complexidade do Objeto

A dispersão temporal no ciclo preparatório é fortemente influenciada pela complexidade da contratação. Abaixo estão os cenários de planejamento calibrados com base na curva empírica de processos no SIGA:

Cenário de Planejamento	Percentil	Dias Úteis	Dias Corridos (~x1.4)	Perfil dos Objetos Telebras & Complexidade Técnica
Melhor Caso (Fast-Track)	P10	41.0 dias	~57 dias (1,5 mês)	Demandas padronizadas, adesões a atas e prorrogações diretas com ETP simplificado.
Caso Mais Provável (Mediana)	P50	60.8 dias	~85 dias (2,7 meses)	Pregões eletrônicos de serviços gerais, licenças de software e compras recorrentes da GCC.
Caso Conservador	P90	75.8 dias	~106 dias (4,2 meses)	Contratações com múltiplos lotes ou necessidade de cotações internacionais complexas.
Pior Caso (Outlier Severo)	P99	98.8 dias	~138 dias (5,7 meses)	Demandas com devolução pela GCC por falhas no ETP, gerando retrabalho de +15 a 30 dias.

5. Decomposição Temporal Detalhada por Etapa do Processo

Etapa do Rito Preparatório	Unidade Responsável	Média (Dias Úteis)	Média (Dias Corridos)	Participação no Ciclo	Classificação de Risco
1. Autuação da Demanda e DFD	Área Requisitante	7.8 dias	~10.9 dias	13.2%	Baixo
2. Elaboração do ETP e Gestão de Riscos	Equipe de Planejamento	34.5 dias	~48.3 dias	58.4%	Crítico (Gargalo)
3. Validação e Aprovação Interna	Gerência / Diretoria	6.2 dias	~8.7 dias	10.5%	Baixo
4. Remessa, Triagem e Análise GCC	GCC (Lotação 2600)	10.6 dias	~14.8 dias	17.9%	Médio (Risco Retrabalho)
TOTAL DO CICLO PREPARATÓRIO	Fluxo Integrado SIGA	59.1 dias	~82.8 dias	100,0%	Meta: <= 60 dias úteis

6. Diretrizes Estratégicas para o Calendário de Contratações 2027

1. **Marco Temporal de 60 Dias Úteis (Regra dos 3 Meses):** Nenhuma demanda administrativa deve ser autuada com menos de 3 meses de antecedência da data pretendida de contratação, sob pena de perda da janela licitatória.
2. **Apoio Preventivo na Pesquisa de Preços (IN 65/2021):** Como o ETP consome **57,9% do tempo total**, a GCC deve disponibilizar bancos de preços praticados e minutas padronizadas para reduzir o tempo da equipe técnica de 34,5 para 20 dias.
3. **Checklist Pré-Saneamento (Zero Retrabalho):** Evitar que os autos sejam devolvidos no 'Caminho Vermelho' por inconsistências em cotações, o que adiciona de 15 a 30 dias de atraso e compromete a execução anual.
