


DOSSIÊ EXECUTIVO: FASE DE SELEÇÃO E GESTÃO DO CICLO DE VIDA CONTRATUAL

Mapeamento do Rito no SIGA: Do Calendário de Contratações até a Assinatura (ou Instrumento Substituto), Prorrogação, Reajuste e Aditivos

CICLO DE SELEÇÃO MÉDIO 64.5 dias úteis ~90 dias corridos (3,0 meses)	INSTRUMENTO SUBSTITUTO 2 a 4 dias úteis Redução de 75% no tempo formal	MARCO CRÍTICO T-120 120 dias antes 22 contratos já atingiram o marco	REAJUSTE / APOSTILA 5 a 8 dias úteis Anualidade (sem parecer CONJUR)	TETO LEGAL ADITIVO ± 25% do Valor Art. 81 Lei 13.303 (Fato Superveniente)
--	--	--	--	---

1. Esteira Macro: Da Homologação do Calendário à Gestão e Fiscalização




2. Quadro Comparativo: Prazos e Ritos da Fase de Seleção e Formalização

Etapa do Processo no SIGA	Unidade Responsável	Prazo Médio	Fundamentação Legal (Lei 13.303)	Documentos Obrigatórios no SIGA
Elaboração de TR e Edital	Área Requisitante & GCC	15 a 20 dias úteis	Art. 31 e 40 (Definição clara do objeto)	Termo de Referência, Matriz de Riscos, Pesquisa de Preços
Análise Jurídica Prévia	CONJUR / Jurídico	10 a 15 dias úteis	Exame prévio de legalidade das minutas	Parecer Jurídico Conclusivo nos autos
Sessão Pública de Licitação	Pregoeiro / CPL (GCC)	25 a 35 dias úteis	Princípios da impessoalidade e vantajabilidade	Ata da sessão, propostas ajustadas e certidões fiscais
Contrato Formal (Padrão)	Diretoria & GCC	8 a 12 dias úteis	Serviços contínuos, obras e fornecimentos parcelados	Termo de Contrato com assinatura digital e publicação DOU
Instrumento Substituto (OC/NE)	GCC (Lotação 2600)	2 a 4 dias úteis	Art. 132 (Compras de pronta entrega e baixo valor)	Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento emitida

3. Mapa Visual & Arte Gráfica do Fluxo de Seleção e Gestão Contratual

Visualização arquitetural completa dos 4 blocos de governança contratual: Seleção, Formalização (Contrato vs Substituto), Gestão e Fiscalização Ativa (Reajuste, Prorrogação e Aditivos) e Decisão de Encerramento:

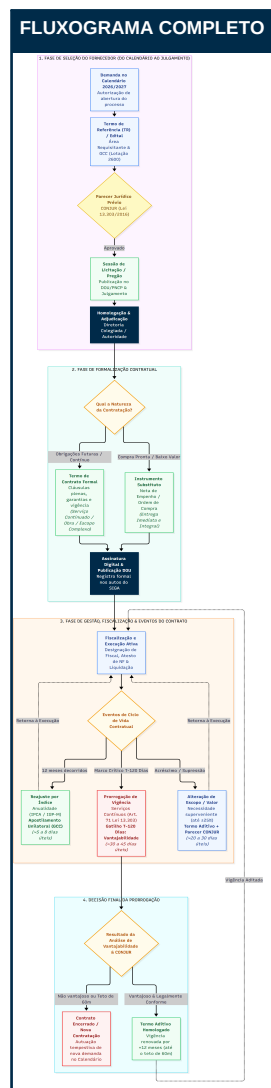

1. BIFURCAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO: CONTRATO FORMAL VS INSTRUMENTO SUBSTITUTO

- **Termo de Contrato Formal:** Mandatório para serviços de natureza contínua, contratos com obrigações de garantia estendida ou obras de infraestrutura. Exige publicação no DOU e rito completo.
- **Instrumento Substituto (Ordem de Compra / Nota de Empenho):** Aplicável para aquisições de entrega imediata e integral, compras de prateleira ou dispensas de baixo valor. Reduz o tempo de 12 para 2 a 4 dias úteis.

2. REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO ESTRITO (APOSTILAMENTO ANUAL)

- **Periodicidade:** Anualidade obrigatória (12 meses decorridos da proposta ou do último reajuste).
- **Rito no SIGA:** Realizado por **simples apostila unilateral** pela GCC, sem necessidade de lavratura de Termo Aditivo bilateral e dispensado de parecer prévio da CONJUR.
- **Celeridade:** Conclusão em **5 a 8 dias úteis** após a publicação do índice oficial pactuado (IPCA, IGP-M, INPC).

3. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E O MARCO CRÍTICO T-120 DIAS

- **Fundamento:** Art. 71 da Lei 13.303/2016 (vigência por até 5 anos / 60 meses para serviços contínuos).
- **GATILHO T-120 DIAS:** A atuação no SIGA deve ocorrer com **120 dias de antecedência** do vencimento.
- **Requisitos Vinculantes:** Relatório de execução técnica do fiscal, comprovação de vantajabilidade de preços frente ao mercado, anuência da contratada, Parecer Jurídico da CONJUR e assinatura **antes do término da vigência**.

4. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE ESCOPO E VALOR (LIMITE LEGAL DE ±25%)

- **Fundamento:** Art. 81 da Lei 13.303/2016 (acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado).
- **Exigências:** Fato superveniente comprovado, planilha analítica de quantitativos, reserva orçamentária e Parecer da CONJUR.

4. Matriz de Alertas Operacionais e Contratos Críticos em 2026

Amostra dos contratos vigentes da Telebras com maior criticidade de prazo para o Marco T-120 dias (Disponível na íntegra na planilha interativa anexa):

Contrato	Processo SIGA	Fornecedor	Término Vigência	Marco T-120	Dias p/ T-120	Status do Alerta	Ação Imediata
TLB-CTR-2026/00009	TLB-PRO-2025/05495	ROL SOLUÇÕES PREDIAIS LTD	03/02/2026	06/10/2025	-358 dias	CRÍTICO: T-120 VENCIDO	Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA...
TLB-CTR-2025/00007	TLB-PRO-2024/02695	EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MA	07/02/2026	10/10/2025	-354 dias	CRÍTICO: T-120 VENCIDO	Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA...
TLB-CTR-2026/00015	TLB-PRO-2024/02695	VIVER EVENTOS LTDA	13/02/2026	16/10/2025	-348 dias	CRÍTICO: T-120 VENCIDO	Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA...
TLB-CTR-2024/00006	TLB-PRO-2023/06316	HC COMUNICAÇÃO DE DADOS L	01/03/2026	01/11/2025	-332 dias	CRÍTICO: T-120 VENCIDO	Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA...
TLB-CTR-2024/00007	TLB-PRO-2023/06327	HC COMUNICAÇÃO DE DADOS L	01/03/2026	01/11/2025	-332 dias	CRÍTICO: T-120 VENCIDO	Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA...
TLB-CTR-2024/00035	TLB-PRO-2023/00762	CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO	03/03/2026	03/11/2025	-330 dias	CRÍTICO: T-120 VENCIDO	Autuação IMEDIATA de Prorrogação no SIGA...

5. Recomendações de Governança para Gestores e Fiscais de Contrato (SIGA)

- Cumprimento Rígido do Marco T-120 Dias:** O gestor ou fiscal deve autuar o processo de prorrogação no SIGA exatamente 120 dias antes do término da vigência. A inércia pode acarretar a extinção irreversível do contrato por decurso de prazo, impossibilitando aditivos posteriores.
- Pesquisa de Vantajabilidade Tempestiva:** O parecer da CONJUR para prorrogação exige que a pesquisa de preços comprove que as condições atuais são mais vantajosas que uma nova licitação. Iniciar a pesquisa com 90 dias evita correria na fase jurídica.
- Uso Sistemático de Apostilamento:** Para reajustes por índice inflacionário pactuado (IPCA/IGP-M), não tramitar Termo Aditivo. A GCC deve emitir a simples apostila no SIGA em até 8 dias úteis, garantindo a recomposição econômico-financeira sem sobrecarregar a Diretoria.
- Monitoramento do Limite de 25%:** Toda alteração de escopo deve ser precedida de verificação de saldo na planilha simuladora, evitando ultrapassar o limite rígido do art. 81 da Lei 13.303/2016.
